



Rapport de visite - Ch1 - 20/07/2026

Rapport de Visite AEU

MISSION

Ch1

CLIENT

CI1

TYPE

AEU

DATE

2026-07-20T10:14:09.566Z

En-tête

RAPPORT DE VISITE SPS

Ch1

CLIENT: CI1

LIEU: 14 rue de la croix

DATE: 20/07/2026

RÉSUMÉ DE LA VISITE:

5 photos prises et analysées

1 rapport(s) directive(s)

1 risques élevés identifiés

2 risques moyens identifiés



Observations Principales



Rapport 1 — Pas de photo



Observations

Le coordonnateur signale que le chantier est « plein de boue », ce qui implique des cheminements et zones de travail très glissants. [Anomalie 1] Danger : Perte d'adhérence lors des déplacements et travaux au sol. Risque : Chute de plain-pied, entorses, contusions, possible chute avec heurt contre des éléments du chantier.

Le coordonnateur indique qu'il n'y a « pas de casque pour la majorité des travailleurs ». [Anomalie 2] Danger : Absence de protection de la tête en cas de chute d'objets ou de chute de personne sur sol dur ou irrégulier. Risque : Traumatisme crânien, blessures graves, aggravation des conséquences d'une chute liée à la boue.

Aucun autre EPI (chaussures de sécurité, gants, etc.) n'est mentionné dans les directives. [Observation complémentaire] Danger : Information insuffisante. Risque : Information insuffisante pour évaluer la conformité globale des EPI autres que le casque — précision nécessaire.

Aucun document de coordination (PGC, PPSPS, registre journal, consignes de circulation interne) n'est mentionné dans les directives. [Observation documentaire] Danger : Absence potentielle de formalisation des mesures de prévention, non vérifiable en l'état. Risque : Information insuffisante pour évaluer la conformité documentaire (PGC, PPSPS, etc.) — à vérifier.



Recommandations

Imposer immédiatement le port du casque de protection conforme aux exigences réglementaires pour l'ensemble des travailleurs présents sur le chantier et mettre à disposition un stock suffisant de casques en bon état.

Mettre en place, sans délai, des mesures de sécurisation des cheminements (nettoyage, stabilisation provisoire, cheminements matérialisés, limitation de l'accès aux zones les plus boueuses) afin de réduire le risque de chute de plain-pied.

Rappeler par écrit et lors des causeries sécurité l'obligation de port des EPI, en particulier du casque, et organiser un contrôle systématique à l'entrée du chantier avec consigne d'éloignement en cas de non-respect.

Vérifier et formaliser dans les documents de prévention (PGC, PPSPS — non mentionnés dans les directives, à contrôler) l'analyse des risques liés aux sols boueux et les mesures associées (EPI, cheminements, entretien des voiries chantier).





Références

Code du travail - Articles R4321-4 et R4323-95 (obligations de mise à disposition et de port des EPI, notamment casque de protection).

Code du travail - Article R4534-10 (organisation et sécurité de la circulation et des cheminements sur chantier).

Code du travail - Articles R4532-1 à R4532-98 (obligations relatives aux documents de coordination SPS : PGC, PPSPS, registre journal).

Rapport 2 — 5 photo(s)

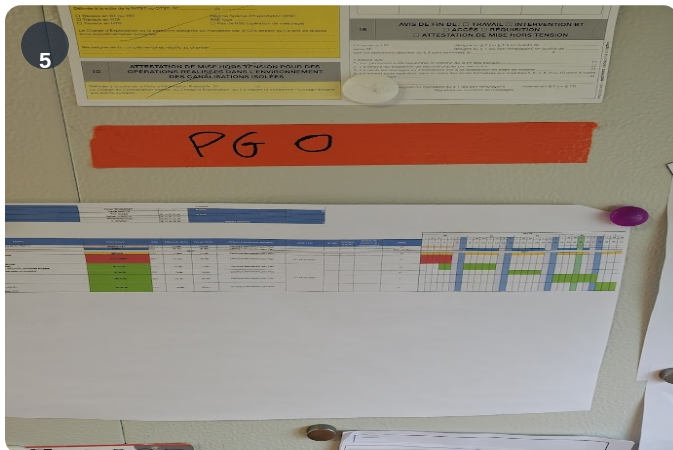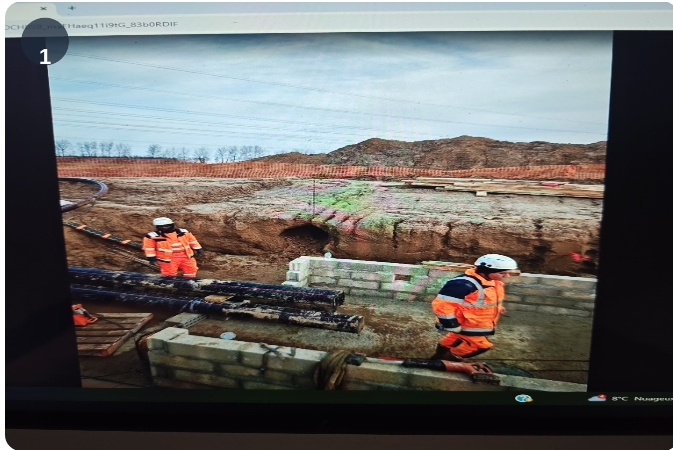

Observations

Chantier de terrassement avec fouille profonde en présence de canalisations/tuyaux de gros diamètre, personnel intervenant au fond de fouille et en pied de talus. 1) Fouille profonde non blindée avec talus quasi verticaux, sol gorgé d'eau et ruissellements visibles Danger : Instabilité immédiate des parois, risque d'éboulement massif sur les opérateurs travaillant en pied et au fond de fouille. Risque : Ensevelissement partiel ou total, écrasement, décès ou blessures graves. 2) Circulation et stationnement de personnel au fond de fouille parmi des tuyaux volumineux et palettes, sans cheminement sécurisé Danger : Obstacles multiples, sols boueux et irréguliers, risques de déséquilibre au contact des matériaux stockés. Risque : Chutes de plain-pied, entorses, chutes avec heurt contre tuyaux et blocs béton. 3) Présence d'eau dans le fond de fouille et sur les cheminements, avec tuyaux et potentiels équipements noyés dans la boue Danger : Dégradation de la portance des talus et du fond, masquage des irrégularités, aggravation du risque d'éboulement. Risque : Glissades, chute dans une zone en eau, aggravation des conséquences en cas d'ensevelissement. 4) Absence de protection collective en périphérie immédiate de la fouille (pas de barriérage rigide type Heras/K2 au droit des zones de circulation) Danger : Risque de chute dans fouille pour les piétons ou engins circulant en bordure. Risque : Chute de hauteur dans fouille, traumatisme lourd. 5) Matériel et palettes disposés en désordre, partiellement en surplomb du vide de fouille Danger : Glissement ou basculement d'objets vers le fond de fouille, notamment au passage des opérateurs ou des engins. Risque : Chute d'objets sur les travailleurs, contusions, écrasement de membres. 6) Balisage plastique type grillage orange en sommet de talus, discontinu et non fixé de manière rigide Danger : Balisage purement symbolique, ne s'oppose pas à une chute et peut donner un faux sentiment de sécurité. Risque : Chute dans la fouille malgré la présence visuelle du balisage.

Recommandations

Mettre à l'arrêt immédiat les travaux en fouille tant que la stabilité des parois n'est pas sécurisée par blindage adapté ou par reprofilage en talus conformes aux règles de l'art et au type de sol.

Faire procéder sans délai à un pompage et à l'évacuation de l'eau de la fouille, puis vérifier la stabilité des talus avant toute reprise de travail.

Installer un barriérage rigide type Heras/K2 en périphérie de la fouille, avec portillons d'accès contrôlés et signalisation claire des zones interdites au public et aux engins.

Interdire le stockage de matériaux, palettes et tuyaux en bord de fouille ; organiser des zones de stockage à distance suffisante du talus (au minimum le retrait égal à la profondeur de la fouille).

Mettre en place des cheminements sécurisés (passerelles avec garde-corps, platelages antidérapants) pour l'accès au fond de fouille, et maintenir ces accès dégagés de tout obstacle.

Rappeler par causerie sécurité les règles spécifiques de travail en fouille (risque d'ensevelissement, interdiction de présence en pied de paroi non protégée, gestion de l'eau) et consigner ces mesures dans le PPSPS.

Références

Code du travail - Article R4534-24 et R4534-22.

Code du travail - Article R4534-10.

Code du travail - Articles R4532-1 à R4532-98.

Conclusion

Des actions correctives immédiates sont nécessaires pour les risques élevés identifiés.

Date: 20/07/2026

Rapport généré le lundi 20 juillet 2026 à 12:44:07

Document confidentiel - Tous droits réservés
